

المقاول

شركة طرق الرياض للمقاولات

وكالة التعمير والمشاريع

الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف

إدارة تنفيذ الطرق

الاستشاري

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

☒

تقديم جديد

مشروع تلال الغروب

☐

إعادة تقديم

استمارة طلب تسليم رقم

الاعمال المساحية و الترابية

عرض الشارع: 9.7

PED 01

رقم الشارع :

رقم المخطط : BLOCK11

اسم الحي : الامير فواز

الى محطة رقم : 214.60+0

00+0

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE2

اعمال اخرى :

التاريخ :

توقيع مهندس الموقع :

توقيع المهندس المشرف :

المختبر

المساح

المراقب

ملاحظات المراقبة :

جاهز

غير جاهز

☒

☐

ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة :

الى المحطة :

من المحطة :

الى المحطة :

من المحطة :

اخرى

القطاع العرضي

القطاع الطولي

مرفقات :

متطابق

غير متطابق

☒

☐

ملاحظات :

الى محطة :

من محطة :

التاريخ :

توقيع المساح :

نتيجة تدقيق المواد :

الرطوبة المثلي :

قيمه البركتور :

مرفق

تصنيف المواد

غير مرفق

☐

☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

التاريخ :

التوقيع :

راسب

ناجح

النتيجة :

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

غير موافق

موافق

التوقيع :

التاريخ :

التوقيع :

مندوب المقاول :

تم الاستلام :

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات												الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية			
تقرير إستلام طبقة ردم																			
إسم المشروع :-				تلال الغروب				رقم الشارع :-				PED-B11-01							
رقم المخطط :-				BLOCK II				عرض الشارع :-				214.60 M							
رقم الطبقة :-				BOTTOM OF SUPGRADE-1				WIDHT-R				4.850							
				LAYAER THICKNESS				WIDHT-L				4.850							
				DEOTH FROM TOP SUB G								0.150							
												0.000							
PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L	R			CL width from L	CL width from R	H						
SLOPE				1.00%	-0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.50%	1.00%									
				-4.850	-3.350	-2.350	0.000	2.350	3.350	4.850									
1	0+000.00	528747.093	2370311.106	52.830	52.815	52.820	52.820	52.820	52.815	52.830	4.850	4.850							
2	0+012.50	528758.631	2370306.299	52.748	52.733	52.738	52.738	52.738	52.733	52.748	4.850	4.850							
3	0+025.00	528770.170	2370301.492	52.667	52.652	52.657	52.657	52.657	52.652	52.667	4.850	4.850							
4	0+037.50	528781.709	2370296.684	52.585	52.570	52.575	52.575	52.575	52.570	52.585	4.850	4.850							
5	0+050.00	528793.247	2370291.877	52.310	52.295	52.300	52.300	52.300	52.295	52.310	4.850	4.850							
6	0+062.50	528804.786	2370287.070	51.933	51.918	51.923	51.923	51.923	51.918	51.933	4.850	4.850							
7	0+075.00	528816.325	2370282.263	51.843	51.828	51.833	51.833	51.833	51.828	51.843	4.850	4.850							
8	0+087.50	528827.863	2370277.455	51.752	51.737	51.742	51.742	51.742	51.737	51.752	4.850	4.850							
9	0+100.00	528839.402	2370272.648	51.602	51.587	51.592	51.592	51.592	51.587	51.602	4.850	4.850							
10	0+112.50	528850.941	2370267.841	51.255	51.240	51.245	51.245	51.245	51.240	51.255	4.850	4.850							
11	0+125.00	528862.479	2370263.033	51.077	51.062	51.067	51.067	51.067	51.062	51.077	4.850	4.850							
12	0+137.50	528874.018	2370258.226	50.985	50.970	50.975	50.975	50.975	50.970	50.985	4.850	4.850							
13	0+150.00	528885.556	2370253.419	50.893	50.878	50.883	50.883	50.883	50.878	50.893	4.850	4.850							
14	0+162.50	528897.095	2370248.612	50.654	50.639	50.644	50.644	50.644	50.639	50.654	4.850	4.850							
15	0+175.00	528908.634	2370243.804	50.356	50.341	50.346	50.346	50.346	50.341	50.356	4.850	4.850							
16	0+187.50	528920.172	2370238.997	50.272	50.257	50.262	50.262	50.262	50.257	50.272	4.850	4.850							
17	0+200.00	528931.711	2370234.190	50.188	50.173	50.178	50.178	50.178	50.173	50.188	4.850	4.850							
18	0+212.50	528943.250	2370229.383	50.104	50.089	50.094	50.094	50.094	50.089	50.104	4.850	4.850							
19	0+214.60	528945.188	2370228.575	50.090	50.075	50.080	50.080	50.080	50.075	50.090	4.850	4.850							
الإستشاري				المقاول				شركة طرق الرياض للمقاولات											
مكتب رمك للإستشارات الهندسية																			
الإسم :-												الإسم :-							
التوقيع :-												التوقيع :-							
التاريخ :-												التاريخ :-							





In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.40
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	10/07/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط فلان القروب	Sample By	Mohmoud
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Block 11 Street 1 STA 0+000 to STA 0+214

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+080	2.291	2.149	6.6	98.1	
2	0+120	2.278	2.145	6.2	97.9	
3	0+190	2.259	2.131	6.0	97.3	

M.D.D = 2.191 kg/m3
O.M.C = 7.52 %


The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.


The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by
[Signature]



Approved by
[Signature]



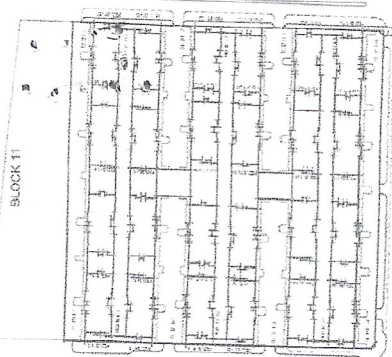

اسفلت قائم
الخط التجميعي
الارض الطبيعية
اتجاة تصريف المياه

المملكة العربية السعودية
إمانة مدينة جدة
الإدارة العامة للطرق والإدارة
إدارة تقسيم الطرق

المالك / وذرة الاسكان

المطور / شركة ساني العا

الاستشاري العام / الأجنبي

الاستشارى / مكتب رمك

المقاول / شركة طرن ال

قصص

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

تاریخ	تاریخ	تاریخ
تاریخ	تاریخ	تاریخ
تاریخ	تاریخ	تاریخ
تاریخ	تاریخ	تاریخ

مدیر امداد و تصمیم الط	1:500	مقیاس الرسم:
	1:500	

